



**de Vries
& van de Wiel**

Dredging & Environmental Solutions



LIEBREGTS

AANNEMINGSBEDRIJF VAN GROND- WEG- EN WATERBOUW

datum 20 april 2017

onderwerp **Werkzaamheden dijkversterking Westdijk Eemdijk Noord**

Beste bewoners van de Eemdijk, Maatweg en andere geïnteresseerden,

Graag willen we u op de hoogte brengen van het volgende:

Grondwerk

De afgelopen weken is er alweer veel werk verzet. Zo is het grove grondwerk bijna klaar. Dit betekent dat we met de wat meer gedetailleerde afwerking verder gaan. Op enkele lokaties is deze afwerking al uitgevoerd.

Op maandag 24 april voeren we het grove grondwerk uit rondom en bij Eemdijk 2. Ook wordt volgende week het grondwerk bij de afschuiving naast de palendijk uitgevoerd.



Inzaaien

Alle delen van de dijk waar grondwerk heeft plaatsgevonden worden ingezaaid. Daarnaast worden delen ingezaaid waar specifieke afspraken over zijn gemaakt met eigenaren. Vooruitlopend op het inzaaien worden delen waar het grondwerk nog erg grof is met een roter bewerkt waardoor de grondstructuur fijner wordt. Het inzaaien van delen die nog niet zijn ingezaaid vindt de komende weken plaats. Er wordt een grasmengsel ingezaaid waar ook kruiden en bloemenzaden aan toe zijn gevoegd. De grasmat wordt totdat deze goed is aangeslagen onderhouden door het waterschap. Daarna wordt het beheer van verschillende delen, indien van toepassing, overgedragen aan de bewoners.

Gedetailleerde afwerking

We zijn inmiddels aan de zogenaamde gedetailleerde afwerking begonnen. In deze afwerkingslag worden de afspraken uit de verschillende overeenkomsten die bewoners met het waterschap en/of de aannemer hebben afgesloten uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van bestrating, mantelbuizen met of voor elektra en water, trapjes, beschoeiing, keerwanden etc. Zo leggen we bijvoorbeeld volgende week de meeste mantelbuizen voor elektra en/of water bij de verschillende percelen aan. Ook wordt momenteel ter plaatse van Eemdijk 94 een damwand geplaatst.



Inritten naar weilanden dijkvak 1 en 2

Op dijkvak 1 en 2 zijn de inritten naar verschillende percelen voorzien van grasbetontegels. Om voldoende grond tussen de tegels te krijgen is een behoorlijke laag grond over de tegels aangebracht. Deze laag wordt later nog weggeveegd. Tevens zijn op de inritten de oorspronkelijke hekken weer terug geplaatst.

We willen de betrokken eigenaren vragen de eerste periode nog voorzichtig te zijn met het belasten van de inritten. De inritten zijn nog vers en daardoor is er grotere kans op schade aanwezig.

Asfalteren

Hieronder volgt een overzicht met de geplande delen die geasfalteerd worden:

Lokatie	Planning
Dijkovergang naast Eemdijk 26	Maandag 24 april
Dijkovergang naast Eemdijk 4	Dinsdag 25 april
Noorderweg en aansluiting op schuur	Maandag 24 april
Maatweg	Dinsdag 25 april
Dijkovergang naast Eemdijk 10A	Maandag 24 april en dinsdag 25 april


Tijdens het asfalteren is er geen toegang/doorgang op de genoemde lokaties. Ook willen we de direct omwonenden verzoeken op de aangegeven dagen geen voertuigen op de te asfalteren stukken te plaatsen. Enkele uren na het asfalteren kan de weg weer worden opengesteld.

Hekwerken

In tegenstelling tot eerder bericht worden alle landhekken, dit zijn de houten hekken en poorten, in het najaar geplaatst. De stalen hekken plaatsen we wel in mei.

Reden voor het later plaatsen van de landhekken is de eerste periode van maaibeheer door het waterschap. Door de aanwezigheid van deze hekken is het onderhoud in deze periode lastig. Op de lokaties waar de houten hekwerken een overgang vormen van openbaar gebied naar particulier gebied zal een tijdelijke afrastering worden geplaatst bestaande uit houten palen met staaldraad.

Het principe van het houten hekwerk is op verzoek van diverse bewoners gewijzigd, zie onderstaande tekening. Het gaas in het hek wordt niet zoals eerder aangegeven onder de plank tot op het maaiveld aangebracht, maar de onderste plank wordt verlaagd tot ongeveer 10 cm boven het maaiveld en daartussen wordt het gaas geplaatst. Hierdoor is het gras rondom het hek beter te onderhouden.

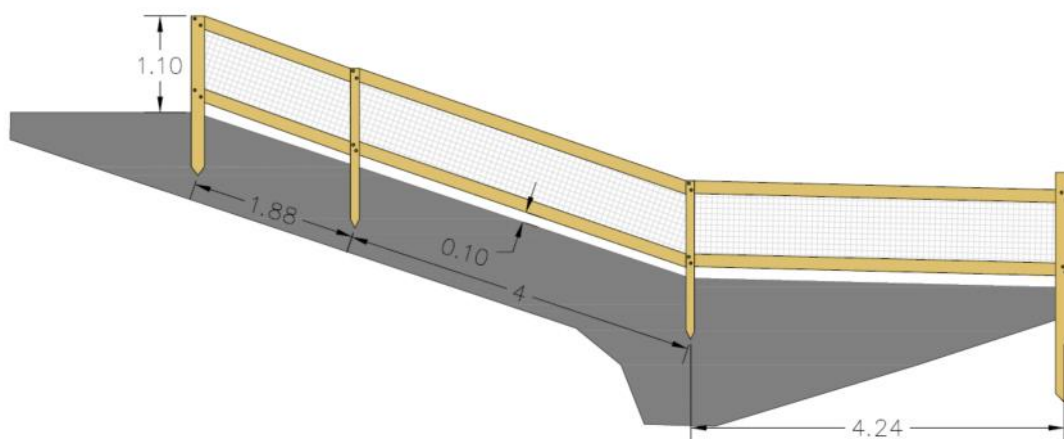

Rietcompensatie

Er wordt volop gewerkt aan het realiseren van de zogenaamde rietcompensatie.

De grond met de rietwortels, die eerder was verwijderd en langs de oevers lag opgeslagen,

wordt nu weer op genoemde locatie teruggeplaatst. De gedachte is dat de levende wortelstokken, die in deze grond zitten, straks vanzelf weer zullen uitgroeien tot riet

Om te zorgen dat het net aangelegde gebied wordt beschermd tegen wegspoelen of wegslaan van de grond door golfslag, wordt een beschermende beschoeiing in het water geplaatst. Die bestaat uit naaldhouten palen met daartussen wiepen van wilgenteen. Het aanbrengen van de grond en beschoeiing gebeurt vanaf een drijvend ponton. We verwachten eind april met deze werkzaamheden klaar te zijn.



Steiger zeeverkenners

Ter plaatse van de steiger van de zeeverkenners vinden momenteel baggerwerkzaamheden plaats. De toegang tot de steiger wordt voordat deze in gebruik wordt afgemaakt.

Proefopstelling dijk depot zuid

Een onderzoekscommissie is voornemens op het voormalige zuidelijke gronddepot een proefopstelling van een dijkvak op te bouwen. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zijn recent door Fugro ter plaatse sonderingen gemaakt. Een informatiebijeenkomst over deze opstelling wordt op 16 mei a.s. gehouden. Het waterschap stuurt voor deze bijeenkomst binnenkort uitnodigingen.

Gemelde schade

De firma Lengkeek heeft de afgelopen periode bij de meeste mensen die schade hebben gemeld opnames gedaan. De resterende opnames worden, tenzij anders afgesproken, volgende week uitgevoerd. Na de laatste opnames ontvangen wij de resultaten en conclusies van de rapportage en neemt ik contact op met de betrokken bewoners om de resultaten door te spreken en vervolgspraken te maken.

Opleveren – akkoord op uitgevoerde werkzaamheden

Zoals ook aangegeven in de opgestelde werkplannen zullen we u na afronding van de werkzaamheden aan uw perceel om een akkoordverklaring vragen. Uitgangspunt daarbij is dat de werkzaamheden conform het opgestelde werkplan zijn uitgevoerd. Middels de akkoordverklaring geeft de eigenaar/pachter aan akkoord te gaan met de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden op zijn/haar perceel. Indien er nog restpunten zijn, dan worden deze op de akkoordverklaring vastgelegd.

Inloopspreekuur woensdag 26 april en 3 mei

In verband met mijn afwezigheid is er op woensdag 26 april en 3 mei geen inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur in de keet.

Ik heb vakantie van donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Aannemerscombinatie de Vries & van de Wiel en FL-Liebregts

Margreet van Zee

Omgevingsmanager

Dijkverzwaren Westdijk – Eemdijk Noord

Tel. 06-12615697

Email: margreet@zeestermanagement.nl
